




Empresa Contratada: JRIBEIRO ENGENHARIA LTDA		Boletim de Medição Nº 02		CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Obra: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE				Contrato Nº	VALOR DO PERÍODO	R\$ 14.286,23
Periodo de: 21/01/2023 a 07/02/2023				Data: 07/02/2023		


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADOS	SALDO
				UNITÁRIO	TOTAL						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.643,85						
01.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,00	R\$ 16,93	R\$ 135,44		8,00	-		R\$ 135,44	-
01.002	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	3,86	R\$ 55,33	R\$ 213,57		3,86	-		R\$ 213,57	-
01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	32,30	R\$ 14,83	R\$ 479,01		32,30	-		R\$ 479,01	-
01.004	Remoção de soleira de marmore ou granito	m	23,00	R\$ 5,72	R\$ 131,56		23,00	-		R\$ 131,56	-
01.005	Demolição de reboco	m2	18,00	R\$ 9,35	R\$ 168,30		18,00	-		R\$ 168,30	-
01.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	9,80	R\$ 18,75	R\$ 183,75		9,80	-		R\$ 183,75	-
01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	98,00	R\$ 3,39	R\$ 332,22		98,00	-		R\$ 332,22	-
02	SUPERESTRUTURA				R\$ 1.385,22					R\$ 1.385,22	
02.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,48	R\$ 2.885,87	R\$ 1.385,22		0,48	-		R\$ 1.385,22	-
03	ELEVAÇÃO				R\$ 1.380,55					R\$ 1.380,55	
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	13,80	R\$ 100,04	R\$ 1.380,55		13,80	-		R\$ 1.380,55	-
04	REVESTIMENTO				R\$ 2.101,94					R\$ 2.101,94	
04.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	45,30	R\$ 10,09	R\$ 457,08		45,30	-		R\$ 457,08	-
04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	23,30	R\$ 38,35	R\$ 893,56		23,30	-		R\$ 893,56	-
04.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	22,00	R\$ 34,15	R\$ 751,30		22,00	-		R\$ 751,30	-
05	PISO				R\$ 6.179,68					R\$ 6.179,68	
05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,32	R\$ 1.190,27	R\$ 1.571,16		1,32	-		R\$ 1.571,16	-


 Daniel Morais de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg.: 270416070-8



Empresa Contratada: JRIBEIRO ENGENHARIA LTDA Obra: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE	Boletim de Medição N° 02	CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
		Contrato N°	VALOR DO PERÍODO	R\$ 14.286,23
Periodo de: 21/01/2023 a 07/02/2023		Data: 07/02/2023		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CONTRATUAL				QUANTIDADES			VALORES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADOS	SALDO
				UNITÁRIO	TOTAL						
05.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	32,50	R\$ 79,82	R\$ 2.594,15		32,50	-		R\$ 2.594,15	-
05.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,75	R\$ 126,74	R\$ 602,02		4,75	-		R\$ 602,02	-
05.004	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	23,50	R\$ 60,10	R\$ 1.412,35		23,50	-		R\$ 1.412,35	-
06	PINTURA				R\$ 15.286,79				R\$ 14.286,23	R\$ 15.286,79	-
06.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	64,50	R\$ 26,47	R\$ 1.707,32	26,70	64,50	-	R\$ 706,76	R\$ 1.707,32	-
06.002	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo	m2	89,11	R\$ 152,39	R\$ 13.579,47	89,11	89,11	-	R\$ 13.579,47	R\$ 13.579,47	-
07	ESQUADRIAS				R\$ 818,50				-	R\$ 818,50	-
07.001	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	1,89	R\$ 43,07	R\$ 81,40		1,89	-		R\$ 81,40	-
07.002	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	m2	1,14	R\$ 646,58	R\$ 737,10		1,14	-		R\$ 737,10	-
TOTAL GERAL					R\$ 28.796,53				R\$ 14.286,23	R\$ 28.796,53	-


 Daniel Morais de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg.: 270416070-8



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Boletim de Medição 02

Período De Execução	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO	CONTRATO
21.01.2023 A 07.02.2023	POÇO VERDE - SE	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE	021/2022



FOTO 01 – ASSENTAMENTO DE PORTA



FOTO 02 – FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS

Daniel
Daniel Moraes de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 270416070-8

Avenida Epifânio Dória, 18
Centro . CEP 49.490-000
CNPJ: 32.741.571/0001-73
www.camarapocoverde.se.gov.br
(79) 3549-1454
cmpocoverde.se@bol.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



FOTO 03 – ABERTURA DE VÃO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE VIDRO

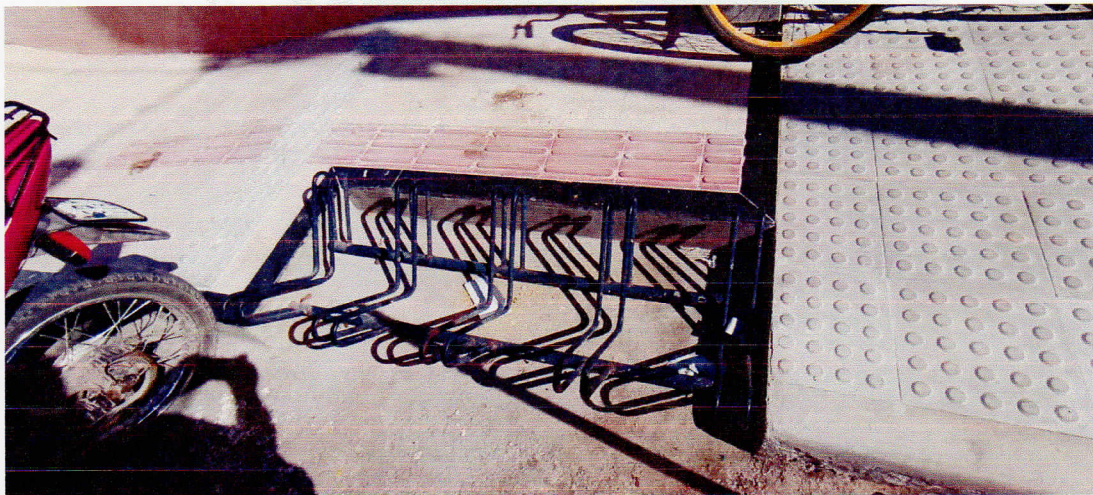


FOTO 04 –ASSENTAMENTO DE BICICLETÁRIO

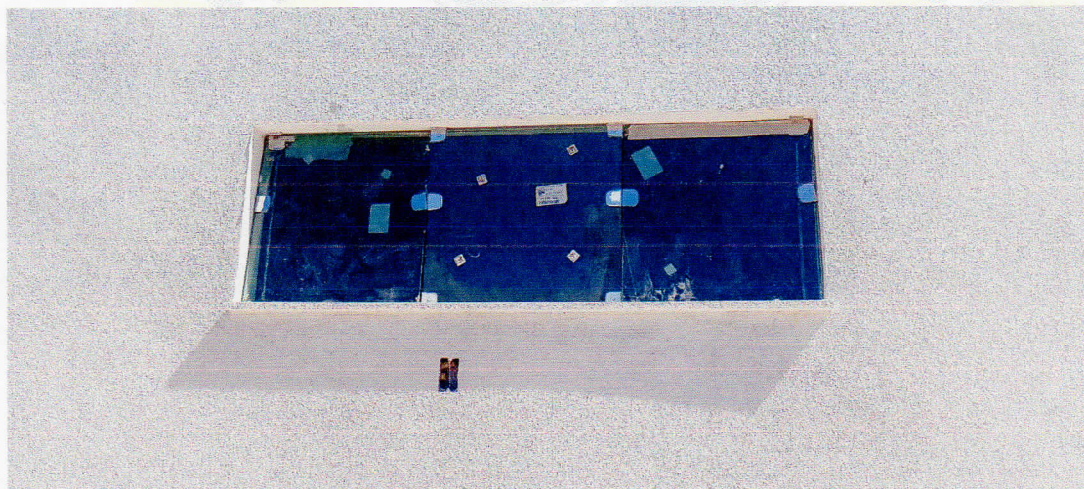


FOTO 05 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VITRÔ PADRÃO

Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 270416070-8

Avenida Epifânio Dória, 18
Centro . CEP 49.490-000
CNPJ: 32.741.571/0001-73
www.camarapocoverde.se.gov.br
(79) 3549-1454
cmpocoverde.se@bol.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



FOTO 06 – EXECUÇÃO DE CALÇADA COM PISÓ ANTIDERRAMENTE E SINALIZAÇÃO TÁTIL, COM RAMPA PADRAO DE ACESSIBILIDADE



FOTO 07 – FECHAMENTOS DE VÃOS E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO CO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO FULGET



FOTO 07 – REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO CO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO FULGET

Daniel
Daniel Moraes de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 270416070-8

Avenida Epifânio Dória, 18
Centro . CEP 49.490-000
CNPJ: 32.741.571/0001-73
www.camarapocoverde.se.gov.br
(79) 3549-1454
cmpocoverde.se@bol.com.br
